

FDG

INFORME DEL 4to. TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR:

MUNICIPIO

UNIDAD PRESUPUESTAL:

TLAHUILTEPA

NOMBRE DEL FONDO O

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA:

SOCIAL MUNICIPAL

ABREVIATURA DEL FONDO

FASIM

O PROGRAMA:

FASIM

EJERCICIO DEL RECURSO:

2025

DATOS DEL ENLACE SRFI

NOMBRE:

FERNANDO HERNÁNDEZ PÉREZ

CARGO:

DIRECTOR DE OBRAS

CORREO ELECTRÓNICO:

fernando_164@hotmail.com

TELÉFONO(S):

771817423

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA


MINISTRACIONES DIRECTAS

X


N°	FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LÍQUIDO	PAGADO		
1	HID25020358692	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL BORDENIO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 27182	2025/FASIM071001	TLAHUILTEPA	538,485.03	538,485.03	538,485.03	538,485.03	538,485.03	538,485.03	100%	
2	HID25020359350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALLE NUMERO A LA IGLESIA - 38378	2025/FASIM071002	TLAHUILTEPA	466,613.27	466,613.27	466,613.27	466,613.27	466,613.27	466,613.27	100%	
3	HID25020359585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALLE NUMERO A LA IGLESIA - 27284	2025/FASIM071003	TLAHUILTEPA	777,466.94	777,466.94	777,466.94	543,660.23	543,660.23	543,660.23	95%	
4	HID25020352663	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE TLAHUILTEPA BARRIO LA RECONVA CALLE PRINCIPAL - 27167	2025/FASIM071005	TLAHUILTEPA	479,920.79	479,920.79	479,920.79	479,920.79	479,920.79	479,920.79	100%	
5	HID25020359552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA UNION CALLE SIN NOMBRE - 27392	2025/FASIM071006	TLAHUILTEPA	395,655.67	395,655.67	395,655.67	395,655.67	395,655.67	395,655.67	100%	
6	HID25020359549	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE AGUA DEL CERRO CALLE SIN NOMBRE - 40789	2025/FASIM071007	TLAHUILTEPA	550,091.43	550,091.43	550,091.43	550,091.43	550,091.43	550,091.43	100%	
7	HID250203516675	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL ROBLE CALLE PRINCIPAL - 28254	2025/FASIM071008	TLAHUILTEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	100%	
8	HID250203516680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE BOCA DE LECON CALLE SIN NOMBRE - 27752	2025/FASIM071009	TLAHUILTEPA	393,206.97	393,206.97	393,206.97	117,962.09	117,962.09	117,962.09	55%	

TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

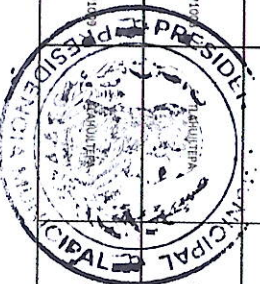

MONITORIO DE RECURSO PRESUPUESTAL										OBSERVACIONES		
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (ADMINISTRADO)	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJECUCIO		PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
9	HID50302528684	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CALE PRINCIPAL - 27184	2025/FASMO71011	TLAHUITEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	469,935.11	100%	
10	HID50302528678	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA CALE SIN NOMBRE - 27338	2025/FASMO71012	TLAHUITEPA	405,230.01	405,230.01	405,230.01	323,762.30	323,762.30	323,762.30	95%	
11	HID50302528653	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE ACAPA - 30122	2025/FASMO71014	TLAHUITEPA	462,398.02	462,398.02	462,398.02	138,719.41	138,719.41	138,719.41	80%	
12	HID50302528681	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE NUEVO MONTEREY CALE DE ACCESO PRINCIPAL - 27328	2025/FASMO71015	TLAHUITEPA	778,761.33	778,761.33	778,761.33	778,761.33	778,761.33	778,761.33	100%	
13	HID50302528651	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE ACAPA CALE NIÑOS HEROS - 28479	2025/FASMO71016	TLAHUITEPA	1,715,451.08	1,715,451.08	1,715,451.08	514,635.32	514,635.32	514,635.32	60%	
14	HID50302528679	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE LUZANO CARRERAS CALE DE ACCESO PRINCIPAL - 27429	2025/FASMO71017	TLAHUITEPA	662,986.54	662,986.54	662,986.54	198,895.96	198,895.96	198,895.96	60%	
15	HID50302528687	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE NUESTRA ERA CALE SIN NOMBRE - 42723	2025/FASMO71020	TLAHUITEPA	839,103.73	839,103.73	839,103.73	839,103.73	839,103.73	839,103.73	100%	
16	HID50302528688	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE EL DOMINI CALE SIN NOMBRE - 42844	2025/FASMO71021	TLAHUITEPA	839,079.01	839,079.01	839,079.01	650,675.71	650,675.71	650,675.71	100%	
17	HID50302528691	CONSTRUCCION DE TECHO EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE XOPA PRIMERA ETAPA - 67238	2025/FASMO71022	TLAHUITEPA	881,629.26	881,629.26	881,629.26	881,629.26	881,629.26	881,629.26	100%	
18	HID50302528690	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 69130	2025/FASMO71023	TLAHUITEPA	501,971.77	501,971.77	501,971.77	501,971.77	501,971.77	501,971.77	100%	
19	HID50302528689	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE CERRO DEL AGUILA CALE PRINCIPAL - 70575	2025/FASMO71024	TLAHUITEPA	591,886.17	591,886.17	591,886.17	177,565.85	177,565.85	177,565.85	80%	
20	HID50302528688	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 74522	2025/FASMO71025	TLAHUITEPA	1,170,429.18	1,170,429.18	1,170,429.18	351,128.75	351,128.75	351,128.75	25%	
21	HID50302528692	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE IZTACIQUILA - 73515	2025/FASMO71026	TLAHUITEPA	979,997.12	979,997.12	979,997.12	293,999.14	293,999.14	293,999.14	30%	



TLAHUITEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

TLAHUITEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

					MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL							PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DIVENDADO	EJERCIDO	PAGADO			
22	HID20302570397	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 72168	2025/FA5M071027	TLAHUITEPA	1,277,399.23	1,277,399.23	1,277,399.23	383,219.77	383,219.77	383,219.77	30%		
23	HID20302570393	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE CHICHICATLA - 71731	2025/FA5M071028	TLAHUITEPA	614,120.29	614,120.29	614,120.29	184,236.09	184,236.09	184,236.09	25%		
24	HID20302570387	AMPLIACION DE CAMINO EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE XILOCAUTLA A POCHTOS - 75038	2025/FA5M071029	TLAHUITEPA	909,555.34	909,555.34	909,555.34	909,222.34	909,222.34	909,222.34	100%		
25	HID20302570386	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE TLAHUITEPA CENTRO CALLE PASQUAL VORALES - 77907	2025/FA5M071030	TLAHUITEPA	1,139,483.72	1,139,483.72	1,139,483.72	341,845.12	341,845.12	341,845.12	25%		
26	HID20302570399	CONSTRUCCION DE CARNETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLAHUITEPA TRAMO NUEVO MONTERREY A POCHTOS - 82800	2025/FA5M071031	TLAHUITEPA	2,418,119.93	2,418,119.93	2,418,119.93	725,435.99	725,435.99	725,435.99	10%		
27	HID20302570386	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE LINDAVISTA - 80358	2025/FA5M071032	TLAHUITEPA	947,310.58	947,310.58	947,310.58	284,193.18	284,193.18	284,193.18	40%		
28	HID20302570394	CONSTRUCCION DE ACANTARILLA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE XILOCAUTLA - 85934	2025/FA5M071033	TLAHUITEPA	626,624.74	626,624.74	626,624.74	188,587.42	188,587.42	188,587.42	50%		
29	HID20302570398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 87340	2025/FA5M071034	TLAHUITEPA	701,487.27	701,487.27	701,487.27	210,446.18	210,446.18	210,446.18	0%		
TOTAL					\$ 22,996,344.64	\$ 22,996,344.64	\$ 22,996,344.64	\$ 12,970,293.45	\$ 12,970,293.45	\$ 12,970,293.45			

NOTA EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO VIO PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TIEMPO DE CORRESPONDENCIA

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR.

ING. CARLOS ALBERTO ARANZAMENDIS MARTINEZ
ENLACE DEL R.F.T. PARA EL F.A.I.S.M.



ING. FERNANDO VILLANUEVA PEREA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JUAN CARLOS LÓPEZ RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TLAHUITEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

TLAHUITEPA
GOBIERNO MUNICIPAL
